ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: *Цимлянское городское поселение Цимлянского района*.
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:
Благоустройство территории парка культуры и отдыха.
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования *реализован*.
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: *по контракту: с 23.07.2021 по 30.09.2021г., фактический срок реализации проекта 10.11.2021.*
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен: *карантин работников подрядчика*.
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока: -.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1.	Демонтажные работы	61,43	ИП Леухов С.А.
2.	Ремонт покрытия тротуара	1 258,45	ИП Леухов С.А.
3.	Малые архитектурные формы	620,12	ИП Леухов С.А.
4.	Демонтаж старых лавочек в зонах отдыха 6 шт.	нефинансовое участие	ИП Волошин Сергей Евгеньевич
5.	Демонтаж качелей на игровой площадке 2 шт.	нефинансовое участие	ЗАО "Приют"
6.	Предоставление специальной техники 4 часа	нефинансовое участие	ООО "Коммунальщик"
	Итого	1 940 000,00	

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)

1	2	3	4	5
Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:	2 179,80	100	1 940,00	100,0
объем средств областного бюджета	1 966,18	90,2	1 749,88	90,2
объем собственных средств местного бюджета	104,63	4,8	93,12	4,8
объем инициативных платежей физических лиц	108,99	5,0	97,00	5,0
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0,00	0,0	0,00	0,0
Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования	Уточнение стоимости работ по результатам прохождения государственной экспертизы сметной стоимости. Экономия по результатам торгов.			

5. Фотоматериалы

№ п/п	Фотография объекта до реализации проекта инициативного бюджетирования	Фотография объекта после реализации проекта инициативного бюджетирования
1.		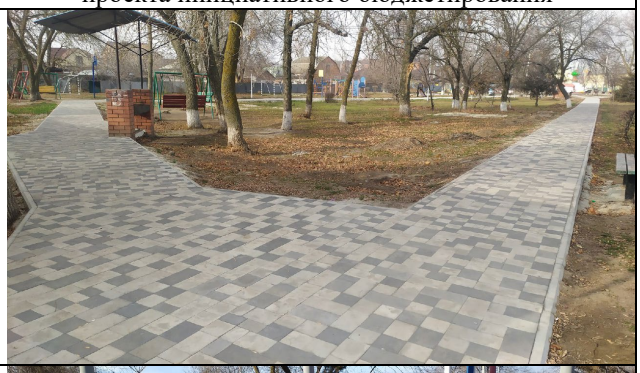
2.		
3.		
